Hierarkia	Selite	Määrä	Yksikkö	Kesto	Aloitushetki	Resurssit
+1	TYöMAAN PERUSTAMINEN	1	ERä	10	15.2.2016	1 kone+RM
+2	TYöMAATIE	1	ERä	10	17.2.2016	1 kone+RM
+3	RAIVAUS	27200	M2	5.1	26.2.2016	1 kone+RM
+4	STABILOINTI	43698	JM	44	1.3.2016	2 konetta
+5	MAANKAIVUU + TäYTTö	41961	M2	72	14.3.2016	1 kone+RM
+6	PAALUTUS	9249	JM	26.1	1.4.2016	1 kone+RM
+7	ALAPOHJATYöT (EI VSS)	32030	M2	45.1	20.4.2016	2 konetta+2 RM
+8	ANTURAT	9045	M2	22	25.4.2016	2 RAM+RM
+9	SOKKELIT	530	M2	20.1	6.5.2016	2 RAM
+10	VäESTöNSUOJA, SIS. AP LAATTA	6190	M2	32	19.5.2016	3 RAM
+11	RUNKO	297674	KG	86	13.6.2016	4-6 RAM+2 RM
+12	ULKOIKKUNAT JA LASISEINäT	1334	M2	69	22.8.2016	2 RAM
+13	IVKH:T JA TEKNIIKKAKUILUT	3219	M2	55	12.9.2016	3 RAM
+14	VESIKATTO	14151	M2	80	26.9.2016	4 RAM
+15	BITUMIKATETYöT	10709	M2	75	10.10.2016	3 RAM
+16	VäLISEINäMUURAUS	700	M2	50	14.11.2016	2 RAM+2 RM
+17	PINTALATTIATYöT	20635	M2	80	12.12.2016	3 RAM
+18	KIPSILEVYVäLISEINäT	1482	M2	70	16.1.2017	3 RAM
+19	TASOITETYöT JA POHJAMAALAUS	14525	M2	80	6.2.2017	3 RAM+2RM
+20	SEINäLAATOITUS	1990	M2	60.1	13.3.2017	4 RAM
+21	HISSIASENNUS	2	KPL	20	27.3.2017	1 RAM
+22	MAALAUS	23658	M2	75	29.3.2017	4 RAM
+23	ALAKATTORUNGOT	13164	M2	80	21.4.2017	3 RAM
+24	LATTIOIDEN PINTARAKENTEET	10937	M2	66	29.5.2017	3 RAM
+25	KIINTOKALUSTEASENNUS	2790	JM	60	19.6.2017	4 RAM
+26	LASISEINäT JA IKKUNAT	584	M2	50	31.7.2017	2 RAM+RM
+27	VäLIOVET	248	KPL	60	7.8.2017	2 RAM
+28	VSS VARUSTEET	482	M2	5	15.8.2017	2 RAM
+29	LISTOITUS	6565	JM	50	28.8.2017	2 RAM
+30	LUKITUS JA HELOITUS	909	KPL	50	11.9.2017	2 RAM
+31	KONEET JA LAITTEET	53	KPL	40	2.10.2017	2 RAM
+32	VARUSTEASENNUS	3563	M2	40	16.10.2017	2 RAM
+33	ALAKATTOLEVYTYKSET JA SEINäVERHOUKSET	1	ERä	40	27.10.2017	-
+34	LOPPUSIIVOUS	48000	RM3	39	6.11.2017	6 RAM
+35	VIIMEISTELYTYöT	2008	JM	45	20.11.2017	2 RAM
+36	ITSELLELUOVUTUKSET			40	1.12.2017	-
+37	TATE VIIMEISTELY	2	ERä	65	4.12.2017	-
+38	TOIMINTAKOKEET	2	M2	25	2.1.2018	-
+39	IRTAIMISTOASENNUKSET	2	ERä	30	8.1.2018	2 RAM
+40	KäYTöN OPASTUKSET	2	M2	20	22.1.2018	-
+41	VIRANOMAISTARKASTUKSET	2	M2	15	7.2.2018	-
+42	LUOVUTUS	6	ERä	1	28.2.2018	-
+43	MAANRAKENNUSTYöT ULKOPUOLI	28200	M2	50	17.3.2016	1 kone+RM
+44	JULKISIVUVILLOITUS	2600	M2	40	5.12.2016	2 RAM
+45	JULKISIVUMUURAUS	3712	M2	100	1.3.2017	3 RAM+2RM
+46	PIHARAKENNUKSET	300	M2	30	3.4.2017	2 RAM+RM
+47	PIHATYöT	30945	M2	80	2.5.2017	4 RAM
+48	PIHAVARUSTEET JA AIDAT	460	JM	45	18.7.2017	2 RAM
+49	ULKOMAALAUS	1343	M2	30	18.8.2017	1 RAM
+50	ASFALTOINTI	5700	M2	20.1	28.8.2017	1 kone+4 RAM
-51	LVV TYöT			913	9.5.2016	
+51.1	VIEMäRIT	2	ERä	136	9.5.2016	-
+51.2	VESI-, LäMPö JA JääHDYTYSJOHDOT	2	ERä	277	12.9.2016	-
+51.3	LATTIALäMMITYS, PATTERIT	2	ERä	252	7.11.2016	-
+51.4	IV-KONEHUONEET	2	ERä	133	6.2.2017	-
+51.5	LVV KALUSTUS	2	ERä	115	5.6.2017	-
-52	IV-TYöT			370	1.12.2016	
+52.1	RUNKOKANAVAT	2	ERä	136	1.12.2016	-
+52.2	IV-KONEHUONEET	2	ERä	114	1.12.2016	-
+52.3	PääTELAITTEET	2	ERä	120	2.5.2017	-
-53	SÄHKÖTYÖT			842	1.2.2017	
+53.1	KAAPELIREITIT	2	ERä	214	1.2.2017	-
+53.2	KAAPELOINTI	2	ERä	205	28.3.2017	-
+53.3	IV-KONEHUONEET	2	ERä	142	9.5.2017	-
+53.4	KESKUKSET	2	ERä	136	26.5.2017	-
+53.5	VALAISINASENNUS JA KALUSTUS	2	ERä	145	12.6.2017	-
-54	RAU			328	2.5.2017	
+54.1	KONEHUONEET	1	ERä	157	2.5.2017	-
+54.2	KENTTäLAITTEET	2	ERä	103	1.8.2017	-
+54.3	TESTAUKSET	2	ERä	44	1.12.2017	-
+54.4	KäYTTöönOTOT	2	ERä	24	15.1.2018	-
-55	LUOVUTUSVAIHE TATE			91	27.11.2017	
+55.1	TOIMINTAKOKEET	3	ERä	37	27.11.2017	-
+55.2	MITTAUKSET JA TARKASTUKSET	3	ERä	20	2.1.2018	-
+55.3	ITSELLELUOVUTUKSET	3	ERä	14	16.1.2018	-
+55.4	KORJAUKSET	3	ERä	5	25.1.2018	-
+55.5	YHTEISKOEKäYTTö	3	ERä	5	31.1.2018	-
+55.6	KäYTTäJäKOULUTUKSET	3	ERä	10	1.3.2018	-

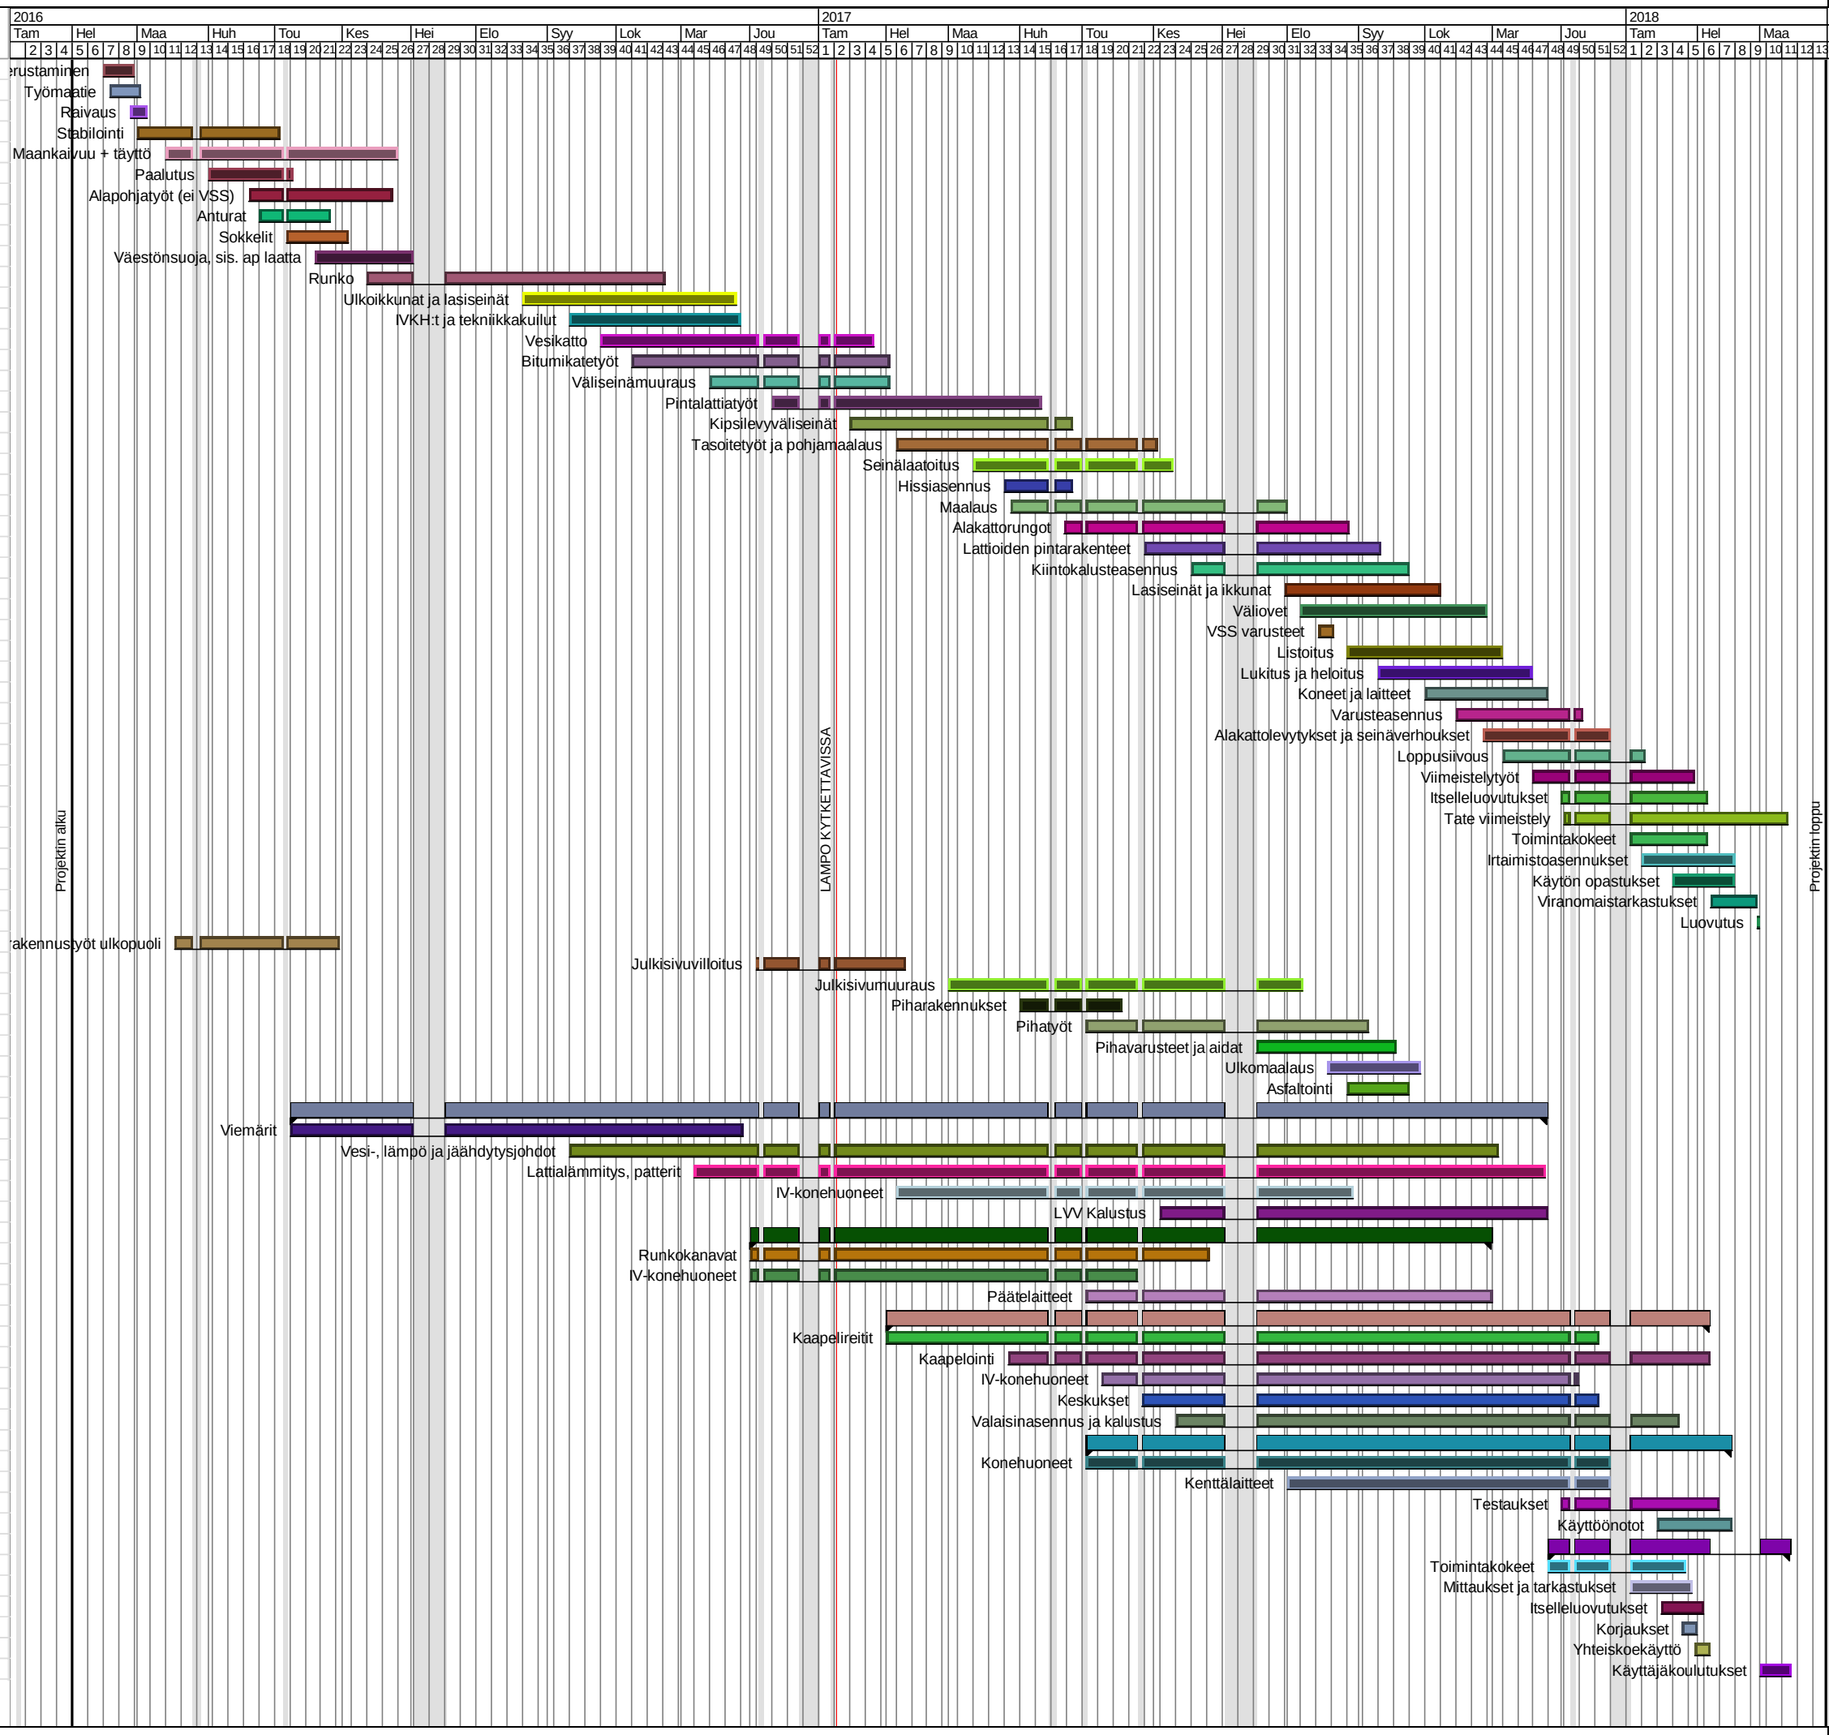

Suunnittelutila

Vico Control 2009 v4.0.40.62800
